



2026

Bilan triennal d'animation

Période mars 2023 - mars 2026



Site Natura 2000 FR7200673
Grottes d'Azerat

Azerat & Saint Rabier (24)



SOMMAIRE

Sommaire	1
Liste des figures	2
Liste des tableaux	2
Intervenants	3
Présidence du Comité de Pilotage.....	3
Structure animatrice.....	3
Site Natura 2000 et enjeux de conservation	5
Objectifs du Docob	6
Bilan triennal d'animation	7
Objet et périmètre du bilan.....	7
Analyse des résultats au regard de la commande régionale (CCTP)	7
Adéquation du CCTP aux enjeux	7
Forces identifiées.....	7
Limites identifiées.....	7
Bilan de la mise en oeuvre de la contractualisation.....	9
Bilan cartographique	11
Analyse de la mise en œuvre du DOCOB.....	16
Bilan de la mise en œuvre du DOCOB détaillé par action	16
Discussion des résultats.....	20
Perspectives pour la prochaine phase d'animation.....	24

Référence à utiliser

QUERO N., 2026. Bilan triennal d'animation du site Natura 2000 FR7200775 « Grottes d'Azerat». Convention cadre Région/Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, 27p.

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Périmètre du site Natura 2000	4
Figure 2: Grand/Petit Murin en léthargie hivernale	5
Figure 3: Vue générale des Grottes du Douime.....	5
Figure 4: Minioptères de Schreibers en léthargie hivernale	6
Figure 5: Bilan des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la période 2023-2026.....	14
Figure 6: Bilan des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la période 2023-2026.....	15

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Objectifs de site et objectifs opérationnels du site Natura 2000.....	6
Tableau 2: Synthèse du programme d'action 2023-2026.....	8
Tableau 3: Bilan de la contractualisation des MAEC sur la période 2023-2026	10
Tableau 4: Tableau de bord de la mise en œuvre des actions du DOCOB.....	17
Tableau 5: Tableau de bord de la mise en œuvre des actions du DOCOB – suite	18
Tableau 6: Tableau de bord de la mise en œuvre des actions du DOCOB – suite et fin.....	19
Tableau 7: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB	21
Tableau 8: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB - suite	22
Tableau 9: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB - suite et fin.....	23

INTERVENANTS

PRESIDENCE DU COMITE DE PILOTAGE

Dans le cadre de la prise de compétence au 1^{er} janvier 2023 par la Région Nouvelle-Aquitaine de la gestion des sites terrestres Natura 2000, la Présidence par délégation du Président de la Région Nouvelle-Aquitaine est assurée par Fanny CASTAGNEDE, élue régionale.

STRUCTURE ANIMATRICE

Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine a été désigné structure animatrice du site Natura 2000 dans le cadre du marché public de prestations intellectuelles « Animation du Document d'objectifs de sites Natura 2000 sur les territoires de la Dordogne (24), de la Corrèze (19), de la Vienne (86) et de la Creuse (23) » référencé sous le numéro 20221000^E07591 proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine.

L'animation du site est assurée par Nolwenn QUERO, chargée de missions au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, antenne de Dordogne située au 212 Boulevard des Saveurs, 24 660 Coulounieix-Chamiers.

Le site des « Grottes d'Azerat » (FR7200673) est situé en Dordogne au sein du Périgord Noir. Le périmètre du site s'étend sur deux communes (Azerat et St-Rabier) et appartient au bassin versant de la Dordogne.

À mi-chemin entre Périgueux et Brive-la-Gaillarde, les « Grottes d'Azerat » se situent à l'extrémité orientale du canton de Thenon et au nord-ouest du canton voisin de Terrasson-la-Villedieu sur la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort. Le périmètre du site est de **462,4 ha** (figure 1).



Site Natura 2000 FR7200673 "Grottes d'Azerat"

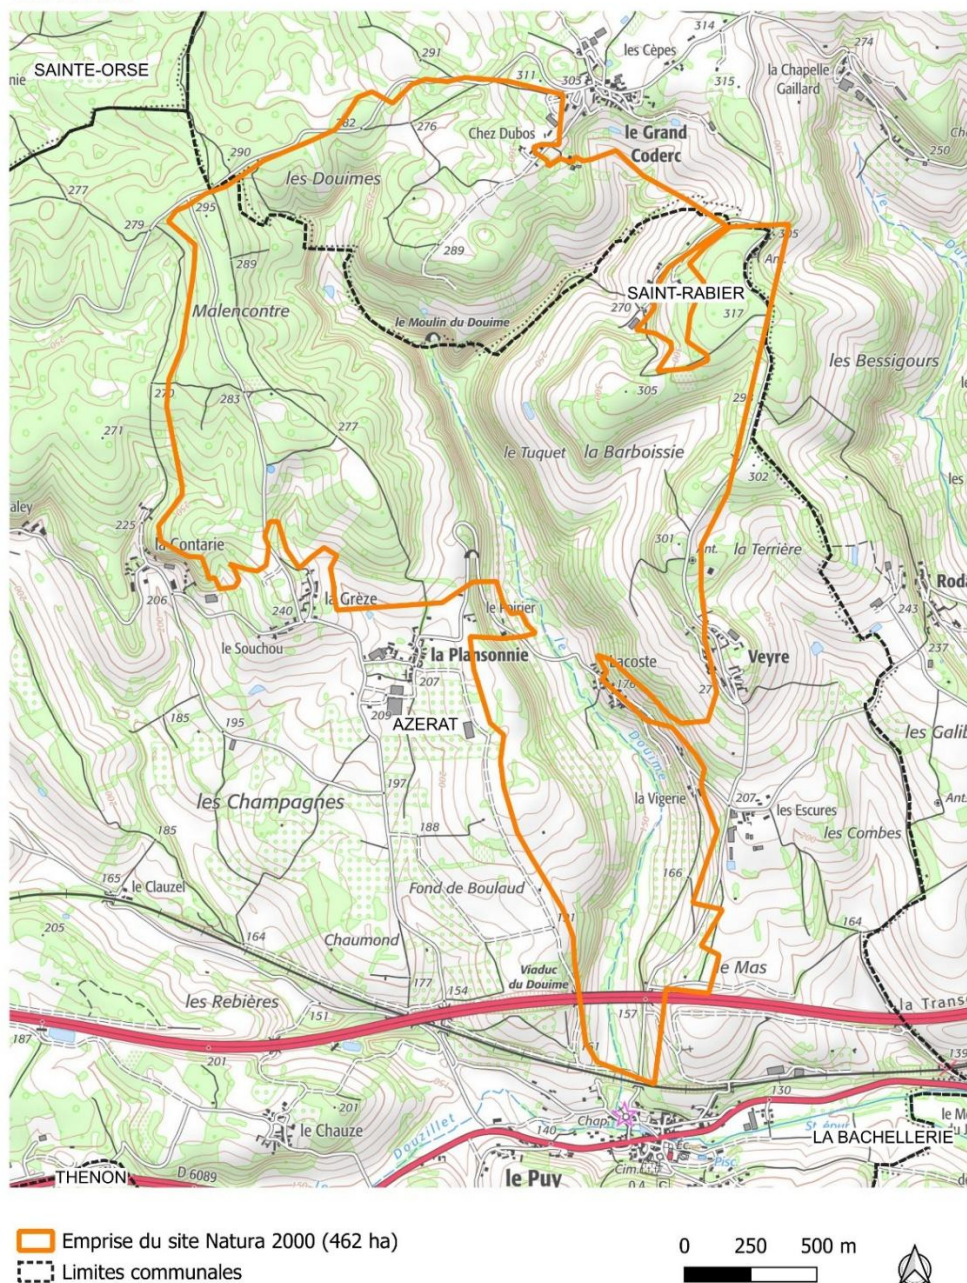


Figure 1: Périmètre du site Natura 2000

Il prend en compte les gîtes de mise-bas et d'hibernation de populations de chauves-souris avec la présence de plusieurs cavités, et une partie des territoires de chasse de ces dernières.

L'intérêt du site Natura 2000 repose sur la présence de huit espèces de chauves-souris qui occupent ces cavités en fonction de la période de l'année. C'est notamment en période de mise-bas et de transit (de début mars à fin novembre) du Grand/Petit Murin que l'on peut souligner l'intérêt primordial de la protection des populations présentes.



Figure 2: Grand/Petit Murin en léthargie hivernale

Le document d'objectifs (DOCOB) a été validé le par le Comité de pilotage (COPIL) le 13 novembre 2007. Le 1er juillet 2008, les collectivités locales ont décidé de laisser la présidence du Copil et le pilotage de l'animation aux services de l'État. Depuis le 6 janvier 2009, le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN Nouvelle Aquitaine) est la structure animatrice du site.

SITE NATURA 2000 ET ENJEUX DE CONSERVATION

Le site des « Grottes d'Azerat » a été proposé comme site d'intérêt communautaire (SIC) car il présente un enjeu fort vis à vis des chauves-souris. Plusieurs cavités naturelles sont incluses au sein du périmètre :

- ✓ la grotte du Douime Ouest qui accueille six espèces et présente un intérêt particulièrement marqué pour la période de mise bas du Grand/Petit Murin et l'estive du Minioptère de Schreibers. La cavité présente un intérêt **régional** pour les chiroptères selon la méthodologie élaborée dans le cadre du PNA Chiroptères.
- ✓ la grotte du Douime est / Grotte du Moulin, qui abrite différentes espèces tout au long de l'année. La cavité présente un intérêt **local** pour les chiroptères.
- ✓ la grotte du Poirier qui en accueille cinq en période hivernale. La cavité présente un intérêt **local** pour les chiroptères.



Figure 3: Vue générale des Grottes du Douime



Figure 4: Minioptères de Schreibers en léthargie hivernale

OBJECTIFS DU DOCOB

Les objectifs du site Natura 2000 des « Grottes d'Azerat » se déclinent sous la forme de 4 objectifs de site et 12 objectifs opérationnels (tableau I). Ils constituent ainsi les lignes directrices à suivre pour la phase d'animation du site.

Tableau 1: Objectifs de site et objectifs opérationnels du site Natura 2000

O1 Conserver les espèces d'intérêt communautaire et patrimonial
O11 Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies de chauves-souris
O12 Favoriser des territoires de chasse potentiellement utilisés par les chauves-souris
O2 Assurer le suivi du site afin d'évaluer la conservation des espèces
O21 Suivre et connaître les colonies de chauves-souris sur l'ensemble du cycle biologique
O22 Evaluer la fréquentation humaine dans la grotte principale du Douime
O23 Suivre l'évolution des habitats d'espèce sur le site
O24 Evaluer l'impact éventuel de l'autoroute A89 sur la colonie en chasse
O25 Évaluer la conservation des espèces et des habitats d'espèces (bilan et expertise)
O3 Valoriser et sensibiliser à la conservation du site et de ses espèces
O31 Mettre en place de la sensibilisation vis à vis de l'utilisation des vermifuges type ivermectine
O4 Animer l'application du Document d'Objectifs
O41 Préparer la mise en œuvre du Document d'objectifs
O42 Mettre en œuvre des mesures contractuelles
O43 Mettre en œuvre des mesures hors contrat
O44 Coordonner, réaliser la synthèse et le bilan

BILAN TRIENNAL D'ANIMATION

OBJET ET PERIMETRE DU BILAN

Le présent rapport constitue la synthèse triennale des actions d'animation du site Natura 2000, réalisée en fin de troisième année d'exécution de la mission confiée par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Elle vise à :

- ✓ Apprécier l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire,
- ✓ Analyser les résultats obtenus au regard de la commande régionale (CCTP),
- ✓ Identifier les forces et limites de la mise en œuvre,
- ✓ Dégager des perspectives d'adaptation pour les programmes d'animation futurs.

ANALYSE DES RESULTATS AU REGARD DE LA COMMANDE REGIONALE (CCTP)

ADEQUATION DU CCTP AUX ENJEUX

L'analyse du bilan triennal montre une bonne adéquation du CCTP avec :

- ✓ les enjeux biologiques du site,
- ✓ le contexte local,
- ✓ les moyens humains et techniques mobilisés.

La commande régionale a permis :

- ✓ la continuité des suivis biologiques,
- ✓ la sensibilisation des propriétaires et du grand public aux enjeux du site
- ✓ d'engager des réflexions autour de la contractualisation
- ✓ une animation administrative conforme aux obligations réglementaires.

Le Tableau 2: Synthèse du programme d'action 2023-2026 en page suivante présente une synthèse des actions menées dans le cadre du programme d'animation 2023-2026.

FORCES IDENTIFIEES

- ✓ Priorisation efficace des actions à forte valeur ajoutée écologique.
- ✓ Gouvernance fonctionnelle (COPIL, bilans, reporting).
- ✓ Intégration du site dans des dynamiques partenariales régionales.
- ✓ Implication dans le réseau des animateurs régional et du CEN Nouvelle-Aquitaine

LIMITES IDENTIFIEES

- ✓ Outils inopérants rendant impossible certaines actions : outil SIN2 déconnecté mais non remplacé, interface animateur pour la mise à jour du FSD non déployé à ce stade.
- ✓ Difficultés de contractualisation sur site

Tableau 2: Synthèse du programme d'action 2023-2026

		2023-2024	2024-2025	2025-2026	Résultats
1-Animation	1-1 Poursuivre les actions de sensibilisation, d’information, de communication				
	Publication de bulletins d’information	X		X	- 2 éditions de Natur'Actu publiées (bulletin de liaison)
	Sites Internet	X	X	X	- site internet maintenu et actualisé régulièrement, documents de référence accessibles.
	Documents de communication		X		- 2 brochures spécifiques au site produites : Présentation du site et Outils de gestion
	Animation d'une réunion publique ciblé		X		- 1 réunion en mairie, 1 réunion sur le terrain
	Articles dans les journaux	X		X	- 2 propositions faites aux collectivités, en attente de retour
	1-2 Organisation et animation de sorties de terrain pour le grand public ou les scolaires		X	X	- 1 Nuit de la chauve-souris organisée à Azerat
	1-3 Échanger avec d’autres animateurs de sites Natura 2000	X	X	X	- participation à plusieurs réseaux et temps d’échanges inter-animateurs.
		2023-2024	2024-2025	2025-2026	Résultats
2-Assistance technique	2-1 Contractualisation des actions du DOCOB				
	Recensement et contact des signataires potentiels	X	X		- 1 Contrat déposé en 2023 puis abandonné. Aucune possibilité de contrat en 2024 (pas d'appel à projets de la Région) et aucun projet n'a émergé en 2025
	Assistance technique et administrative des signataires				
	Diagnostic préalable	X		X	
	Formulaires de demande d’aide	X		X	
	Proposition de contrat	X		X	
	Suivi et évaluation des contrats		X	X	- aucun contrat en cours sur le site.
	Renseignement dans le système d’information des sites Natura 2000 « SIN2 »	X			- outil complété avec les données relatives à la contractualisation sur site. Arrêt de SIN 2 entre le 31 décembre 2024 et le 31 janvier 2025.
	2-2 Animation de la charte Natura 2000 dans les politiques publiques	X	X	X	- proposition de charte aux différents acteurs et propriétaires, en attente de retour favorable
	2-3 Assistance technique				
	Régime d'évaluation des incidences Natura 2000	X	X	X	- pas de sollicitation pendant la période considérée
	Assistance technique des porteurs de projet	X	X	X	- pas de sollicitation pendant la période considérée
	2-4 Actions non contractuelles (hors contrats Natura 2000)				
	Phase de programmation	X	X	X	- intégration du site dans des programmes (Chiroptères cavernicoles prioritaires en Nouvelle-Aquitaine) et projets partenariaux (FNE NA, SFEPM, ...)
	Phase de mise en œuvre	X	X	X	
	2-5 Réunions avec les services de la Région Nouvelle-Aquitaine	X	X	X	- participation à 3 réunions annuelles avec le référent départemental et webinaires régionaux.
		2023-2024	2024-2025	2025-2026	Résultats
3-Suivi du site et du DOCOB	3-1 Suivi biologique du site	X	X	X	- suivis biologiques réalisés annuellement sur le site ; résultats analysés et présentés en comité de pilotage.
	3-2 Suivi socio-économique	X	X	X	- veille continue assurée sur les activités et projets à proximité du site.
	3-3 Mise à jour du DOCOB et des FSD	X			- FSD mis à jour et transmis à la DREAL, en attente d'instruction auprès du MNHN
	3-4 Évaluation de l’état de conservation des sites	X	X	X	- aucune sollicitation des services de l'Etat
		2023-2024	2024-2025	2025-2026	Résultats
4- Assistance administrative	4-1 Organisation des COPILs				
	Organisation	X	X	X	- comités de pilotage organisés annuellement ; orientations et ajustements de l’animation validés collectivement.
	Préparation et présentation	X	X	X	- préparation et présentation systématiques des bilans et actions en COPIL.
	Rédaction CR	X	X	X	- comptes rendus rédigés et diffusés après chaque COPIL.
	4-2 Elaboration de compte rendu et bilans				
	Elaboration d'un compte-rendu d'activité à mi-parcours	X	X	X	- comptes rendus d’activité intermédiaires réalisés.
	Elaboration du bilan d'animation annuel	X	X	X	- bilans d’animation annuels rédigés et transmis.
	Elaboration du bilan triennal d'animation			X	- bilan triennal d’animation réalisé.

Action non programmée

X

Action programmée et réalisée

X

Action programmée et partiellement réalisée

X

Action programmée et non réalisée

BILAN DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONTRACTUALISATION

Sur la période considérée, aucun contrat Natura 2000 n'a pu aboutir et des difficultés sont récurrentes pour faire émerger de nouveaux projets (foncier morcelé, complexité administrative du montage des contrats, éligibilité des parcelles).

Le bilan est plus positif concernant les MAEC, car le dispositif est bien connu localement et de nouvelles parcelles ont pu être engagées. Des craintes sont toutefois apparues récemment concernant, à la fois le financement des mesures en elles-mêmes et l'absence de financement de l'animation propre aux MAEC (démarchage et aide au montage pour les exploitants agricoles).

Tableau 3: Bilan de la contractualisation des MAEC sur la période 2023-2026

PAEC NA_BD24	mesure	Nom mesure	unitaire	engagées	Linéaire (ml)	ans
	CIFF	Création de couverts d'intérêt faunistique et floristique	652 €/ha	0	0	- €
	CPRA	Création de prairie	358 €/ha	0	0	- €
	ESP2	Protection des espèces - Retard de fauche au 5 juin (25 jours)	145 €/ha	0	0	- €
	ESP3	Protection des espèces - Retard de fauche au 15 juin (35 jours)	200 €/ha	0	0	- €
	ESP4	Protection des espèces - Retard de fauche au 25 juin (45 jours)	254 €/ha	6	61,04	77 520,80 €
	MHU2	Préservation des milieux humides - amélioration de la gestion par le pâturage	201 €/ha	0	0	- €
	OUV2	Maintien de l'ouverture des milieux - amélioration de la gestion par le pâturage	204 €/ha	0	0	- €
	IAE1	Entretien durable des infrastructures agro-écologiques – Ligneux	0,8 €/ml	0	0	- €
	IAE3	Entretien durable des infrastructures agro-écologiques – Fossés	1,6 €/ml	0	0	- €
TOTAL				5 dossiers	61,04 ha 0 ml	77 520,80 €

PAEC NA_ZP24	Code mesure	Nom mesure	Montant unitaire	Nombre d'exploitations engagées	Surface (ha)	Montant sur 5 ans
	PRA1	Surfaces herbagères et pastorales	51 €/ha	2 dossiers	0	- €
	PRA2	Systèmes herbagers et pastoraux	88 €/ha		45,25	19 910,00 €
	PRA3	Amélioration de la gestion des surfaces herbagères et pastorales par le pâturage	72 €/ha		12,86	4 630,00 €
TOTAL					58,11 ha	24 540,00 €

PAEC NA_EL24	Code mesure	Nom mesure	Montant unitaire	Nombre d'exploitations engagées	Surface (ha)	Montant sur 5 ans
	HBV2	Bien-être animal - Autonomie fourragère - Elevages d'herbivores	177 €/ha	0	0	- €
	HBV3	Bien-être animal - Autonomie fourragère - Elevages d'herbivores	233 €/ha	3	241,99	281 919,00 €
	MONO	Bien-être animal - Elevages de monogastriques, amélioration des parcours	735 €/ha	0	0	- €
TOTAL				3 dossiers	241,99 ha	281 919,00 €

BILAN CARTOGRAPHIQUE

Un bilan cartographique des actions de communication, de contractualisation ainsi que des MAEC est présenté dans les figures ci-après. Les couches SIG correspondantes en format shp sont annexées au présent bilan.

MAEC Biodiversité

Parcelles engagées - 2023-2025 PAEC NA BD24 / Dordogne Secteur Grottes d'Azerat


61 ha
5 exploitants



Mesures MAEC

CIFF	Couvert intérêt faune/flore
CPRA	Création de prairies
ESP2	Retard d'usage 25 à 45 jours
ESP3	
ESP4	
MHU2	Préservation milieux humides
OUV2	Ouverture des milieux
IAE1	Ligneux
IAE3	Fossés

Surface par mesure en ha

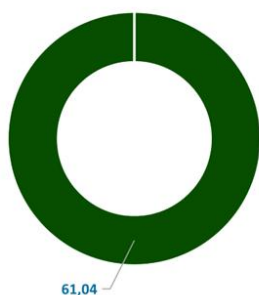


Limites

- Communes
- Périmètre PAEC NA_BD24
- Site Natura 2000 Grottes d'Azerat



0 1 2 km

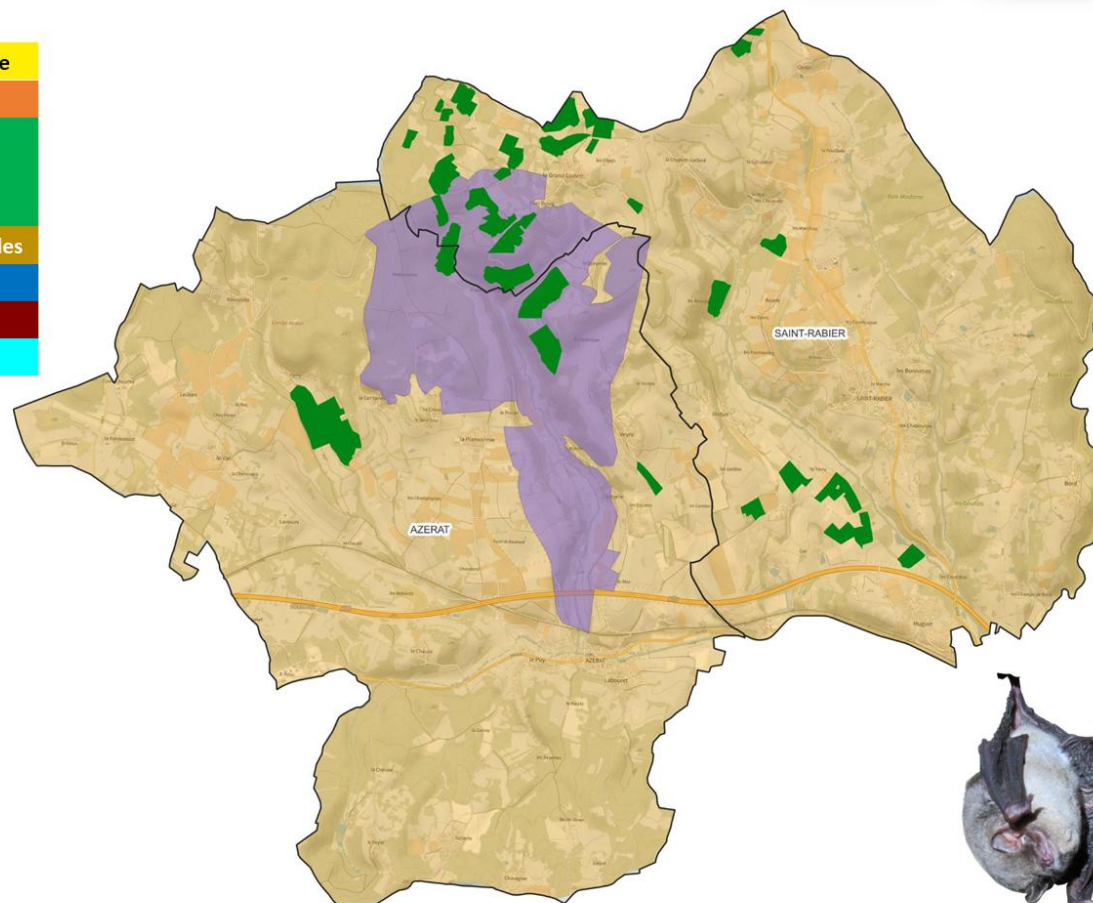

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
DORDOGNE

Conservatoire
d'espaces naturels
Nouvelle-Aquitaine

MAEC Biodiversité

Parcelles engagées - 2023-2025 PAEC NA ZP24 / Dordogne Secteur Grottes d'Azerat


58 ha
2 exploitants



Mesure MAEC engagée



PRA1	}	Surfaces herbagères et pastorales
PRA2		Systèmes herbagers et pastoraux
PRA3		Amélioration gestion des surfaces herbagères et pastorales par pâturage
PRA1 + PRA3		
PRA2 + PRA3		

Surface par mesure en ha

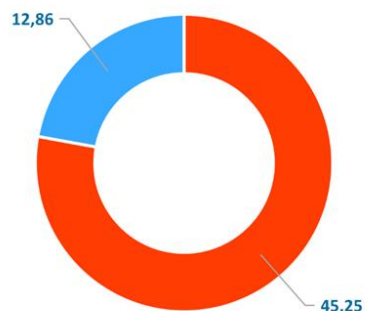

Limites

- Communes
- Site Natura 2000 Grottes d'Azerat

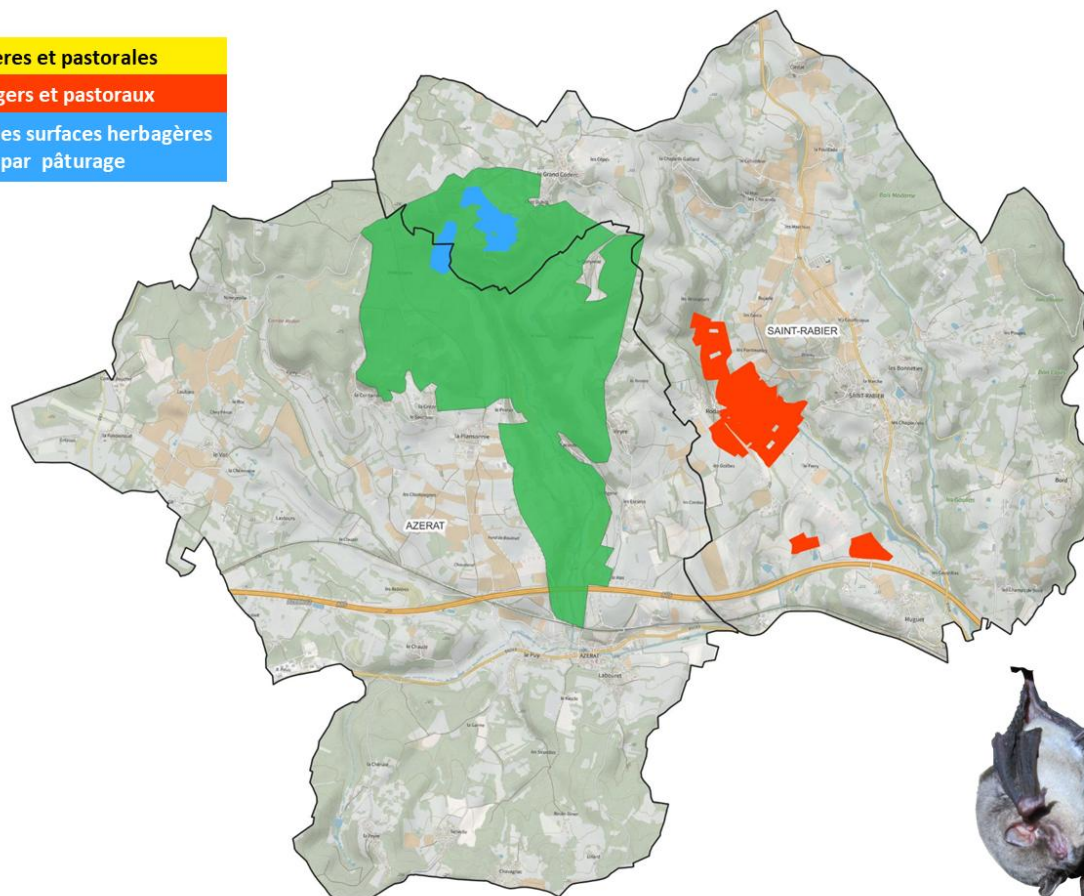


PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

AGRICULTURES
& TERRITOIRES
Liberté
Égalité
Fraternité

Conservatoire
d'espaces naturels
Nouvelle-Aquitaine

Action de sensibilisation, d'information et de communication - Bilan 2023-2026

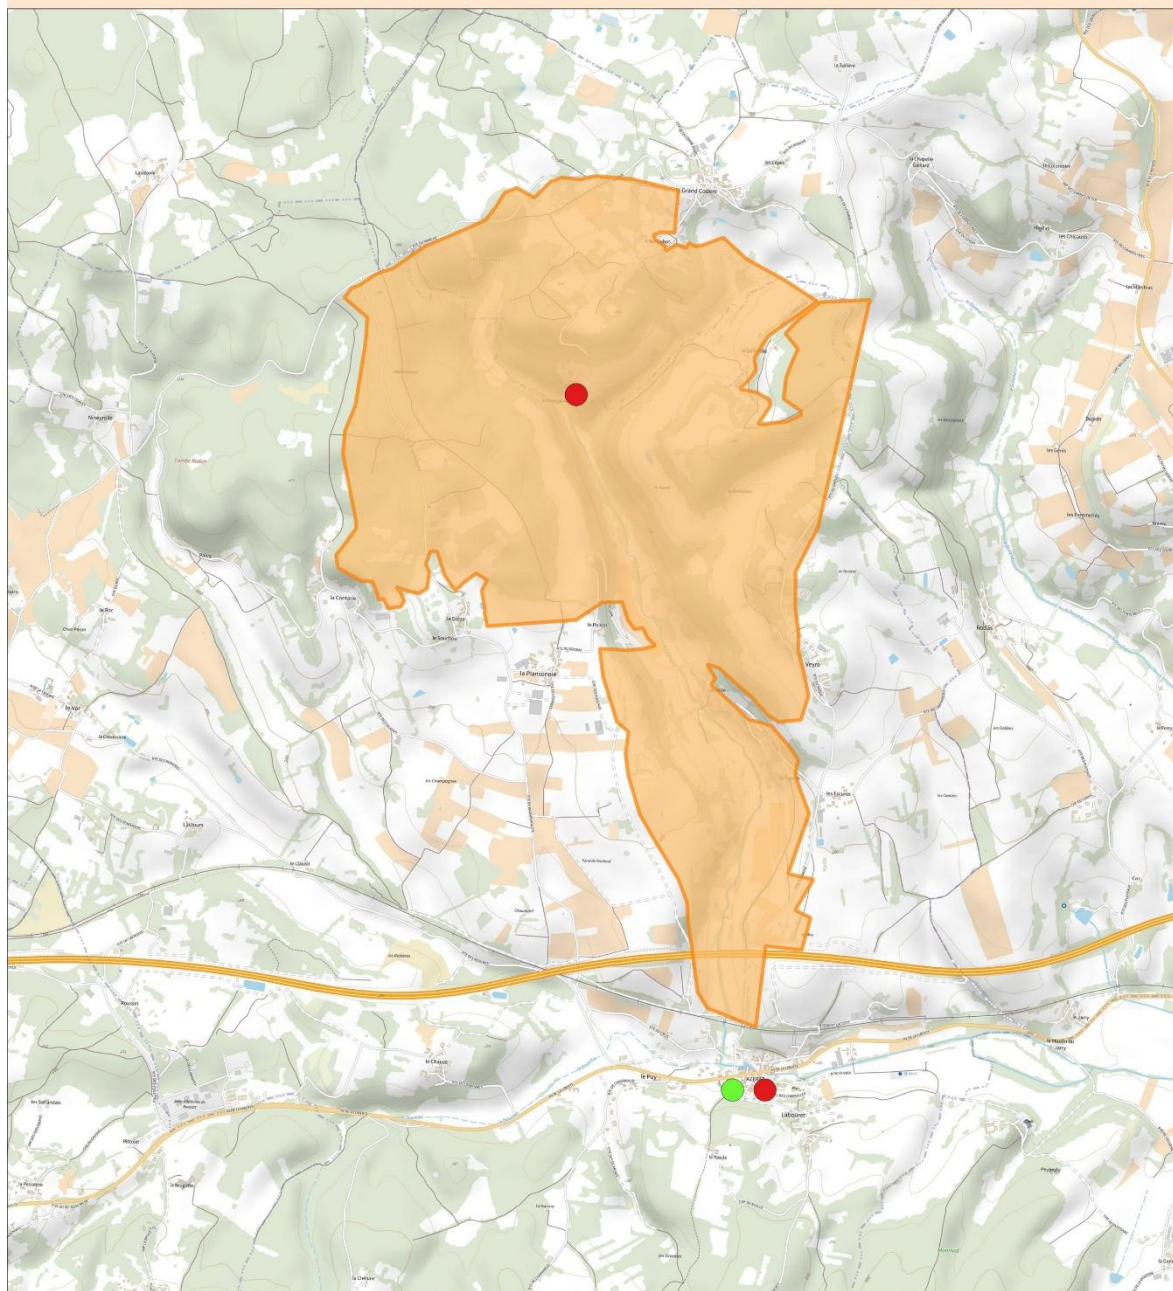

Légende

 Périmètre du site Natura 2000


Actions

 Animation

 Réunion

Figure 5: Bilan des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la période 2023-2026

Contrats et Chartes - Bilan 2023-2026

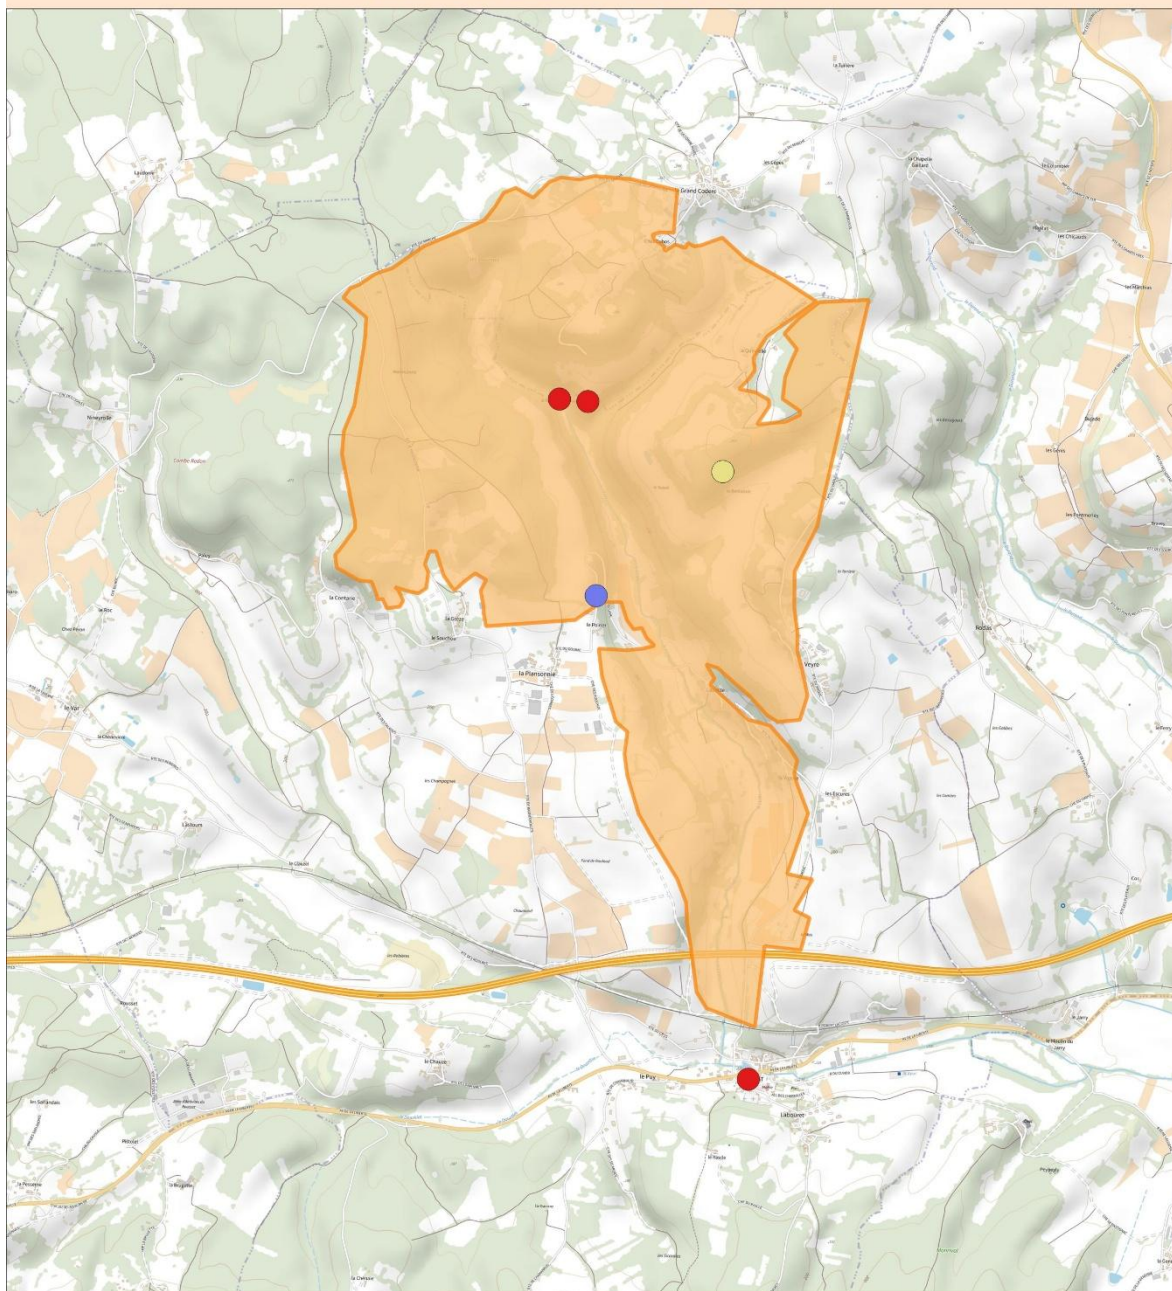

Légende

 Périmètre du site Natura 2000

 Charte Natura 2000 - Refusé

Contractualisation sur le site

 Charte Natura 2000 - En cours

 Contrat N2000 - Abandonné



0 400 800 m

 Conservatoire
d'espaces naturels
Nouvelle-Aquitaine

Figure 6: Bilan des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la période 2023-2026

ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB DETAILLE PAR ACTION

Le DOCOB du site Natura 2000 vise la conservation des espèces d'intérêt communautaire, le suivi du site à travers des actions d'amélioration des connaissances de valorisation et de sensibilisation.

Les résultats obtenus pour chaque action, **depuis le début de la mise en œuvre de l'animation sur site, c'est-à-dire depuis 2009** sont détaillés dans le Tableau 4, le Tableau 5 et le Tableau 6 ci-après.

Tableau 4: Tableau de bord de la mise en œuvre des actions du DOCOB

Code	Objectifs	Code action	Intitulé action	Financements possibles	Priorité	Indicateur	Résultats
O ₁	Conserver les espèces d'intérêt communautaire et patrimonial						
O ₁₁	Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies de chauves-souris	GH1	Mise en place, si nécessaire, d'un périmètre de protection et d'information	CN 2000	1	Nombre de fermeture réalisé	Malgré plusieurs tentatives, refus du propriétaire Accord favorable pour la pose de panneaux d'informations pour deux cavités
O ₁₂	Favoriser des territoires de chasse préférentiellement utilisés par les chauves-souris	GH2	Vergers: Mise en place de traitements phytosanitaires - traitement de lutte	MAEC	1	Surface engagée	Mesure non intégrée au PAE
		GH3	Vergers: Mise en place de traitements phytosanitaires - lutte biologique	MAEC	1	Surface engagée	Mesure non intégrée au PAE
		GH4	Vergers: Mise en place ou élargissement d'un couvert herbacé sous culture ligneuse pérenne	MAEC	1	Surface engagée	Mesure non intégrée au PAE
		GH5	Vergers: Remplacer un traitement chimique (sol) par un traitement mécanique	MAEC	1	Surface engagée	Mesure non intégrée au PAE
		GH6	Création ou restauration de clairières ou de landes	CN 2000	1	Surface engagée	Aucun contrat engagé
		GH7	Travaux d'abattage ou de taille sans enjeux de production	CN 2000	1	Nombre de contrat déposé	Aucun contrat engagé
		GH8	Reconversion des terres arables en herbages extensifs	MAEC	1	Surface engagée	Aucune MAEC engagée sur la période 2023-2026
		GH9	Reconvertir les terres arables en prairies temporaires	MAEC	2	Surface engagée	Aucune MAEC engagée sur la période 2023-2026
		GH10	Ouverture d'une parcelle fortement embroussaillée	MAEC	2	Surface engagée	Aucune MAEC engagée sur la période 2023-2026
		GH11	Ouverture d'une parcelle moyennement embroussaillée	MAEC	2	Surface engagée	Aucune MAEC engagée sur la période 2023-2026
		GH12	Ouverture et maintien de l'ouverture des landes et friches	CN 2000	2	Nombre de contrat déposé	Contrat déposé et validé en 2023 mais abandonné par le porteur de projet par la suite

Tableau 5: Tableau de bord de la mise en œuvre des actions du DOCOB – suite

Code	Objectifs	Code action	Intitulé action	Financements possibles	Priorité	Indicateur	Résultats
O ₂	Assurer le suivi du site afin d'évaluer la conservation des espèces						
O ₂₁	Suivre et connaître les colonies de chauves-souris sur l'ensemble du cycle biologique	SE1	Suivi des populations de chiroptères des grottes	Animation N2000 Hors Contrat	1	Nombre de suivis réalisés	Suivis biologiques réalisés annuellement ; rapports produits et présentés en comité de pilotage.
		SE2	Détermination - identification des espèces Grands Murins / Petits Murins	Animation N2000 Hors Contrat	1	Espèce & statut confirmés sur site	Espèce confirmée sur site. Statut et effectif inconnu.
		SE3	Relevé topographique de la grotte principale du Douime	Animation N2000 Hors Contrat	1	Document produit	Topographie produite en 2010
O ₂₂	Evaluer la fréquentation humaine dans la grotte principale du Douime	SE4	Evaluation de la fréquentation humaine dans la grotte principale du Douime	Hors Contrat	1	Dispositif de surveillance installé	Action non validée par le propriétaire
O ₂₃	Suivre l'évolution des habitats d'espèce sur le site	SE5	Suivi de l'évolution des habitats d'espèce sur le site	Animation N2000 Hors Contrat	1	Etude réalisée	Action non financée, non réalisée
O ₂₄	Evaluer l'impact éventuel de l'autoroute A89 sur la colonie en chasse	SE6	Programme de suivi par radio-pistage des Grands Murins	Hors Contrat	2	Etude réalisée	Action non financée, non réalisée
O ₂₅	Evaluer la conservation des espèces et des habitats d'espèces (bilan et expertise)	SE7	Evaluer la conservation des espèces et des habitats d'espèces (bilan et expertise)	Animation N2000 Hors Contrat	1	Etude réalisée	Évaluation de l'état de conservation des espèces réalisée à partir des suivis biologiques. Evaluation des habitats d'espèces non réalisée
Code	Objectifs	Code action	Intitulé action	Financements possibles	Priorité	Indicateur	Résultats
O ₃	Valoriser et sensibiliser à la conservation du site et de ses espèces						
O ₃₁	Mettre en place de la sensibilisation vis-à-vis de l'utilisation de vermifuge type Ivermectine	VA1	Mise en place de la sensibilisation vis-à-vis de l'utilisation des vermifuges type ivermectine	Animation N2000 Hors Contrat	1	Nombre d'exploitants sensibilisés	Difficilement évaluable, réalisé au moment des diagnostic parcellaire MAEC ?

Tableau 6: Tableau de bord de la mise en œuvre des actions du DOCOB – suite et fin

Code	Objectifs	Code action	Intitulé action	Financements possibles	Priorité	Indicateur	Résultats
O ₄	Animer l'application du DOCOB						
O ₄₁	Préparer la mise en œuvre du DOCOB	AN1	Identification des ayants-droits sur le site	Animation N2000	1	Action réalisée	Réalisé au fil de l'eau, selon les besoins
		AN2	Information et communication sur les mesures de gestion	Animation N2000	1	Action réalisée	Réalisé au fil de l'eau, selon les besoins
		AN3	Identification des besoins financiers	Animation N2000	1	Action réalisée	Non réalisé sur la période
		AN4	Adaptation des contrats de type CAD en MAET	Animation N2000	1	Action réalisée	Réalisé en 2009 & 2010
		AN5	Rédaction de la charte Natura 2000 sur le site	Animation N2000	1	Charte rédigée	Validation de la charte Natura 2000 (actualisée) lors du COPIL du 24/11/23
O ₄₂	Mettre en œuvre des mesures contractuelles	AN6	Prise de contact avec les ayants-droits	Animation N2000	1	Action réalisée	Réalisé au fil de l'eau, selon les besoins
		AN7	Diagnostic des parcelles	Animation N2000	1	Action réalisée	1 diagnostic réalisé, contrat Natura 2000 abandonné par la suite
		AN8	Proposition de contrats	Animation N2000	1	Nombre de contrats déposés	1 contrat déposé en 2023 mais abandonné par la suite
		AN9	Aide au montage de dossier	Animation N2000	1	Action réalisée	1 contrat déposé en 2023 mais abandonné par la suite
		AN10	Suivi de l'instruction	Animation N2000	1	Action réalisée	Contrat abandonné
		AN11	Aide à la mise en œuvre technique des mesures	Animation N2000	1	Action réalisée	Non réalisé
		AN12	Suivi de la consommation financière et consolidation des besoins	Animation N2000	1	Action réalisée	Non réalisé
O ₄₃	Mettre en œuvre des mesures hors contrat	AN13	Ingénierie financière	Animation N2000	1	Action réalisée	Non réalisé
		AN14	Elaboration du cahier des charges techniques	Animation N2000	1	Action réalisée	Non réalisé
		AN15	Conduite d'opération	Animation N2000	1	Action réalisée	Non réalisé
O ₄₄	Coordonner, réaliser la synthèse et le bilan	AN16	Bilan et évaluation des actions et des contrats	Animation N2000	1	Nombre de documents rédigés	3 bilans annuels produits sur la période 2023-2026
		AN17	Préparation et animation du comité de pilotage	Animation N2000	1	Nombre de réunions réalisées	10 COPIL réalisés depuis le début de l'animation (dont 3 durant la dernière phase d'animation)
		AN18	Coordination des avis techniques	Animation N2000	1	Action réalisée	Non réalisé

DISCUSSION DES RESULTATS

Les tableaux de synthèse du DOCOB (Tableau 7, Tableau 8 et Tableau 9), présentent de manière détaillée la mise en œuvre du document d'objectifs, action par action, incluant l'analyse des résultats, les difficultés rencontrées, les forces et faiblesses des actions ainsi que l'évaluation de l'atteinte des objectifs.

Tableau 7: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB

Objectif DOCOB	Action DOCOB	Actions mises en œuvre et résultats	Analyse des résultats	Difficultés / solutions	Forces / faiblesses de l'action	Évaluation : atteinte des objectifs
O1 - Conserver les espèces d'intérêt communautaire et patrimonial	Mise en place, si nécessaire, d'un périmètre de protection et d'information	Sensibilisation des propriétaires	Accord pour pause de panneaux	Difficultés : Propriétaire peu sensible Solution : Appui politique local à rechercher	Force : Action de fermeture finançable via contrat. Faiblesse : Action soumise à l'accord des propriétaires	Objectif non atteint
	Vergers: Mise en place de traitements phytosanitaires - traitement de lutte	Rédaction de la fiche MAEC, rencontres avec les exploitants	Mesure non intégrée au PAEC	Difficultés : Mesure non intégrée au PAEC Solution :	Force : action cohérente avec les enjeux du site Faiblesse :	
	Vergers: Mise en place de traitements phytosanitaires - lutte biologique					
	Vergers: Mise en place ou élargissement d'un couvert herbacé sous culture ligneuse pérenne					
	Vergers: Remplacer un traitement chimique (sol) par un traitement mécanique					
	Création ou restauration de clairières ou de landes	Sensibilisation du propriétaire, proposition de contrat	Pas de contractualisation	Difficultés : Action soumise à l'accord des propriétaires Solution :	Force : Faiblesse :	
	Travaux d'abattage ou de taille sans enjeux de production	Non réalisé, action peu pertinente		Difficultés : Solution :	Force : Faiblesse :	
	Reconversion des terres arables en herbages extensifs	Rédaction de la fiche MAEC, rencontres avec les exploitants	Pas de contractualisation des mesures	Difficultés : faible temps d'animation alloué aux MAEC, budget limité Solution : augmenter les budgets	Force : action cohérente avec les enjeux du site Faiblesse :	
	Reconvertir les terres arables en prairies temporaires					
	Ouverture d'une parcelle fortement embroussaillée					
	Ouverture d'une parcelle moyennement embroussaillée					
Ouverture et maintien de l'ouverture des landes et friches	Sensibilisation de propriétaire, proposition de contrat	Diagnostic et contrat déposé, contrat abandonné	Difficultés : Mobilisation des propriétaires et mutualisation du foncier Solution : Appui politique local à rechercher	Force : Action favorable au HIC du site (6210 notamment) Faiblesse : Action très ponctuelle à l'échelle du site		
Dispositif favorisant le développement de bois sénescents	Action non mobilisable jusqu'en 2025. Evaluation de la potentialité de contractualisation sur site	Tous les critères d'éligibilité ne sont pas respectés	Difficultés : Foncier éligible rare, mobilisation des propriétaires privés Solution :	Force : Faiblesse : Critères d'éligibilité très restrictifs		

Tableau 8: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB - suite

Objectif DOCOB	Action DOCOB	Actions mises en œuvre et résultats	Analyse des résultats	Difficultés / solutions	Forces / faiblesses de l'action	Évaluation : atteinte des objectifs
O2 - Assurer le suivi du site afin d'évaluer la conservation des espèces	Suivi des populations de chiroptères des grottes	Suivis biologiques réalisés annuellement	Données fiables	Difficultés : Difficultés techniques ponctuelles Solution : Acquisition de matériel	Force : Données robustes et fiables Faiblesse :	Objectif partiellement atteint
	Détermination - identification des espèces Grands Murins / Petits Murins	Suivis biologiques réalisés	Identification à vue de quelques individus	Difficultés : Critères visuels d'identification à vue délicats, manipulation nécessitant une autorisation pour identification sur critère morphologique Solution : Réponse à Appel à projet pour recherche de financement pour monter un projet ambitieux	Force : Données fiables Faiblesse : opération chronophage et impactante sur les populations	
	Relevé topographique de la grotte principale du Douime	Action réalisée auparavant		Difficultés : Solution :	Force : Faiblesse :	
	Evaluation de la fréquentation humaine dans la grotte principale du Douime	Non réalisé, non prévu pendant la période		Difficultés : Action soumise à l'accord des propriétaires. Financements non disponibles pour ce type d'opération Solution : Recherche de financement hors Natura 2000 ?	Force : Données fiables Faiblesse : Trouver le matériel adapté au site (conditions abiotiques et discrétion du dispositif)	
	Suivi de l'évolution des habitats d'espèce sur le site	Non réalisé, non prévu pendant la période		Difficultés : Action non financée via l'animation N2000 Solution : Réponse à Appel à projet pour recherche de financement	Force : Faiblesse : Absence d'état initial, protocole à définir	
	Programme de suivi par radio-pistage des Grands Murins	Non réalisé, non prévu pendant la période		Difficultés : Action non financée via l'animation N2000 Solution : Réponse à Appel à projet pour recherche de financement	Force : Données fiables sur les zones de chasse de la colonie Faiblesse : action coûteuse et chronophages (télémétrie) nécessitant des compétences et des autorisations spécifiques	
	Evaluer la conservation des espèces et des habitats d'espèces (bilan et expertise)	Evaluation des tendances des populations estivales Non réalisé sur les habitats d'espèces	Résultats présentés en COPI et dans les bilans d'animation	Difficultés : Solution :	Force : Données de suivis disponibles et standardisées Faiblesse : Protocole de comptage mis en place depuis trop peu de temps pour avoir des tendances robustes	
O3 - Valoriser et sensibiliser à la conservation du site et de ses espèces	Mise en place de la sensibilisation vis-à-vis de l'utilisation des vermifuges type ivermectine	Difficilement évaluable, réalisé au moment des diagnostics parcellaires MAEC		Difficultés : traçabilité de l'action difficile à réaliser Solution : échanger plus régulièrement avec l'opérateur MAEC	Force : Faiblesse : Temps alloué à l'action. Plus de financement de l'animation MAEC	Objectif partiellement atteint

Tableau 9: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB - suite et fin

Objectif DOCOB	Action DOCOB	Actions mises en œuvre et résultats	Analyse des résultats	Difficultés / solutions	Forces / faiblesses de l'action	Évaluation : atteinte des objectifs
O4 - Animer l'application du DOCOB	Identification des ayants-droits sur le site	Animation assurée sur l'ensemble de la période ; COPIL organisés ; bilans produits.	Gouvernance fonctionnelle permettant l'ajustement des actions.	Difficultés : Solution :	Force : Faiblesse : Mobilisation variable	Objectif atteint
	Information et communication sur les mesures de gestion					
	Identification des besoins financiers					
	Adaptation des contrats de type CAD en MAET					
	Rédaction de la charte Natura 2000 sur le site					
	Prise de contact avec les ayants-droits					
	Diagnostic des parcelles					
	Proposition de contrats					
	Aide au montage de dossier					
	Suivi de l'instruction					
	Aide à la mise en œuvre technique des mesures					
	Suivi de la consommation financière et consolidation des besoins					
	Ingénierie financière					
	Elaboration du cahier des charges techniques					
	Conduite d'opération					
	Bilan et évaluation des actions et des contrats					
	Préparation et animation du comité de pilotage					
	Coordination des avis techniques					

PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PHASE D'ANIMATION

Les enseignements tirés de la période triennale conduisent à :

- ✓ consolider les actions de suivi biologique et d'assistance technique,
- ✓ recentrer les actions de sensibilisation vers des formats ciblés et efficaces (poster, flyer),
- ✓ adapter les modalités de communication au contexte local,
- ✓ maintenir une capacité d'ajustement des actions en fonction des résultats observés.

Ces orientations visent à optimiser l'efficacité de l'animation dans un cadre budgétaire et opérationnel maîtrisé.

Les propositions d'action pour la période 2026-2029 sont les suivantes :

INFORMATION ET SENSIBILISATION

- ✓ Organisation et animation de sortie nature à destination du grand public ou des scolaires
- ✓ Création et diffusion d'un poster du site
- ✓ Création et implantation de panneaux de sensibilisation et d'information aux abords des sites
- ✓ Communication autour des actions réalisées
- ✓ Animation du site internet

CONTRATS ET CHARTES NATURA 2000

- ✓ Préfiguration d'un contrat Natura 2000 de pastoralisme
- ✓ Proposition et signature de la Charte Natura 2000

ACCOMPAGNEMENT ET ANIMATION TERRITORIALE

- ✓ Assistance à l'application du régime d'évaluation des incidences
- ✓ Accompagnement des acteurs du territoire et des collectivités dans leurs éventuels projets en faveur de la biodiversité

SUIVIS SCIENTIFIQUES / INVENTAIRES

- ✓ Suivis biologiques des cavités du site
- ✓ Recherche de financement pour une étude « Petit Murin »

SUIVI DU DOCOB ET DE L'ANIMATION

- ✓ Mise à jour du FSD
- ✓ Mise à jour du DOCOB avec l'intégration des nouveaux enjeux identifiés (rédaction de fiches

habitats et fiches action)

- ✓ Organisation des COPIL
- ✓ Rédaction des bilans



Un outil au service de la biodiversité, des paysages et de l'économie de territoires



Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
www.cen-nouvelle-aquitaine.org

Siège social : 6 ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence

Tél : 05 55 03 29 07
siege@cen-na.org



Contact :
CEN Nouvelle-Aquitaine
Antenne Dordogne
212 Bd des Saveurs - 24660 Coulounieix-Chamiers
Tél : 05 53 81 39 57
antenne24@cen-na.org

avec le concours financier de



*La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire*
